

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المنطقة التاسعة - البحر الأحمر



بيان المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة البحر الاحمر خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥

م	اسم المشروع	الشركة المنفذة	مدة الصلية		تاريخ البدء	تاريخ التهو	قيمة العلية	قيمة المنفذ خلال الشهر	نسبة المنفذ اجمالي المنفذ	نسبة ما تم من اعمال	نسبة ما انقضى من المدة	ملاحظات واسباب التأخير
			يوم	شهر								
اولا :- مشروعات الصيانة تمويل الهيئة العامة للطرق والكبارى												
١	ازدواج طريق سلجنا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم. ط (مرحلة ثانية)	شركة النيل العامة للطرق والكبارى	١٢	٤٤	٢٠١٠/١٢/٢٠	٢٠١٤/٠٩/٢٠	١١٧٢٩٤٥٠٠	٢١١١٥٠٠	%١,٨	%٤٨,٨٦	%١٣٣,٢١	
٢	تقوية و اعادة رصف طريق سلجنا / قنا بطول ٤٠ كم من كم ٤٠ الى حد المنطقة	شركة السلام الترانسبوتال	٥	٣٦	٢٠١٢/٠٣/٢٩	٢٠١٥/٠٤/٠٣	٩٩٤٣٥٦٢,٥	٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩٥,٦٠	%١٢١,٤٥	
٣	معالجة اثر السبول بطريق الزعفرانة / راس غارب / الفرقة وطريق راس غارب / الشيخ فضل	شركة السلام الترانسبوتال	٥	٤٥	٢٠١٢/١١/٢٩	٢٠١٤/٠٩/٠٤	٥٨٦٥٩٩٧٥	١٥٢٨,٦٥	%٢,٦	%٦٢,٤٥	%٧٩,٣٥	
٤	الطريق الدائرى الخارجى لمدينة القصير بطول ٢١ كم. ط (مزوج)	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية	١١	٣٢	٢٠١٣/٠٩/١٥	٢٠١٤/٠٥/٢٦	٨٩٣٥٦٠٠	١٨٩٩٨٠	%٢,٠٩	%٥٠,٠٦	%٨٢,٤٩	
٥	رفع كفاءة طريق الفرقة / راس غارب بطول ٢٠ كم في المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠ شمال الفرقة	شركة النيل العامة لانشاء الطرق	٠	٢٤	٢٠١٥/٠٦/٠٩	٢٠١٥/٠٦/٠٨	٤٨٧٢٤٨٠	١٢٢٢٣٥٢	%٧,٥٣	%٧,٥	%٢٣,١٥	
٦	الصيانة الوقائية والمعالجة لبعض طرق منطقة البحر الاحمر جنوب الفرقة	شركة السلام الترانسبوتال	٠	١٢	٢٠١٥/٠٦/٠٩	٢٠١٥/٠٦/٠٨	٢٦٧٩٩٦٠	٣٥٥٥٢٦	%٠,٦٩	%٦٩	%٢,٤٥	
ثانيا :- مشروعات تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحية												
٧	انشاء و رصف طرق بالمركز السياحى مرسى شجراء بطريق مرسى علم / القصير بطول ٣ كم	شركة السلام الترانسبوتال	٠	١٢	٢٠١٥/٠٣/٢٩	٢٠١٤/٠٣/٢٨	٤٩٣٢٨٨٠	٦٦٩٨٠	%١,٣٦	%٢٢,٦٣	%٥٧,٥٣	
ثالثا :- مشروعات تمويل المحافظة												
٨	اعمال انشاء و رصف طرق داخلية بمدينة سلجنا	شركة السلام الترانسبوتال	١٤	٣٣	٢٠١٣/٠١/١٠	٢٠١٥/٠١/٢٣	٤٧١٥٨٠٠٠	٧٨٧٠٠٠	%١,٦٧	%٤٩,٨٥	%٨٨,٢١	
٩	اعمال رصف شوارع مدينة مرسى علم والتقاطعات والتجارات	شركة النوى	٠	١٥	٢٠١٤/٠٣/٢٣	٢٠١٥/١٢/١٦	١٠٤٥٥٣٤٠	٣١٤٣٥٠	%٣,٠١	%١١,٦٦	%٩١,٧٩	
١٠	اعمال استكمال انشاء و رصف طرق داخلية بمدينة القصير	الشركة القليضة لمشروعات الطرق والكبارى	٠	١٨	٢٠١٥/٠٦/٠٥	٢٠١٥/١٢/٠١	٢٩٨٧٤٠٠٠	٤٥٣٥٥٠	%٣,١٩	%٤٠,٧٨	%٢٥,٩١	

بيان المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة البحر الاحمرحتى اكتوبر ٢٠١٥م تمويل الهيئة العامة للطرق والكبارى

م	المشروع	الشركة	تكلفة المشروع الفعلية	إجمالى المنفذ	نسبة المنفذ	تاريخ نهو الأعمال	نسبة ما انقضى من مدة %
١	ازدواج طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى شركة النيل العامة للطرق كم ٤٠ بطول ٢٠ كم . ط (مرحلة ثانية)	شركة النيل العامة للطرق والكبارى	١١٧٣٩٥٠٠٠	١١٦٠٥٦٦٠	%٩٨,٨٦	٢٠١٤/٠٩/٠٢	%١٣٣,٢١
٢	تقوية و إعادة رصف طريق سفاجا / قنا بطول ٤٠ كم من كم ٤٠ الى حد المنطقة	شركة السلام انترناشيونال	٩٩٧٤٣٥٦٢,٥	٦٣١٠٤٠٢٥	%٩٥,٦٠	٢٠١٥/٠٤/٠٣	%١٢١,٤٥
٣	معالجة اثار السيول بطريق الزعفرانة اراس غارب / الغردقة وطريق راس غارب / الشيخ فضل	شركة السلام انترناشيونال	٥٨٦٥٩٩٧٥	٣٦٩٢٥٢١٨	%٦٢,٩٥	٢٠١٦/٠٩/٠٤	%٧٩,٣٥
٤	الطريق الدائرى الخارجى لمدينة القصير بطول ٢١ كم . ط (مزدوج)	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية	٨٩٣٩٥٦٠٠	٤٤٧٤٩٧٤٠	%٥٠,٠٦	٢٠١٦/٠٥/٢٦	%٨٢,٤٩
٥	رفع كفاءة طريق الغردقة / راس غارب بطول ٢٠ كم فى المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠ شمال الغردقة	شركة النيل العامة لانشاء الطرق	٤٨٧٢٤٨٠٠	٣٦٥٤٧٢٠	%٧,٥	٢٠١٧/٠٦/٠٨	%٢٣,١٥
٦	الصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الاحمر جنوب الغردقة	شركة السلام انترناشيونال	٢٦٧٩٩٦٠٠	٣٥٥٥٣٦	%٦٩.	٢٠١٦/٠٦/٠٨	%٣,٤٥
		الإجمالى	٨٨١٤٣٧٠٧٥	٤٢٠٢١٣٦٨٥	%٤٧,٦٧		

مشروعات المنطقة

اولا:-

ازدواج طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠
الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
(مرحلة ثانية)

مسار مشروع ازدواج طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠
الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم (مرحلة ثانية)



بيان المشروع

- اسم المشروع : ازدواج طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم
- - الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
- - بدء العمل : ٢٠١٠/١٢/٢٠
- - نيهو العمل : ٢٠١٤/٩/٢
- - مدة العملية : ٤٤,٥٠ شهر
- - تم نيهو الاعمال



وصف المشروع

- انشاء ازدواج للطريق فى المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ مدخل طريق الصعيد/البحر الاحمر شاملة أعمال التقوية واعادة الرصف للطريق الحالى مع استبدال المنحنيات الافقية الخطرة بالطريق الحالى كم ٢٧، كم ٣٠، كم ٣٢، كم ٣٧ - تم اختيار مسار الازدواج فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٤٠ خارج المنطقة الجبلية الوعرة التى تمر بها الطريق الحالى لتعزز انشاء الازدواج بجوار الطريق الحالى لصعوبة المنطقة الجبلية وانتشار المرافق بجوار الطريق - تم انشاء الازدواج فى المسافة من من كم ٢٠ حتى كم ٢٥ بالطريق الحالى مع انشاء جزيرة وسطى بعرض ٢ متر مزودة بالحواجز الخرسانية - معالجة النقاط السوداء بالطريق الحالى الذى تم تقويته واعادة رصفه كما هو موضح بالكم ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٧ حيث تم تعديل تصميم المنحنيات الافقية لتناسب مع السرعة التصميمية للطريق

ديجرام سير الأعمال

مشروع ازدواج طريق سفاجا/ قنا من كم ٢٠ الى كم ٤٠ بطول ٢٠ كم . ط (مرحلة ثانية)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى

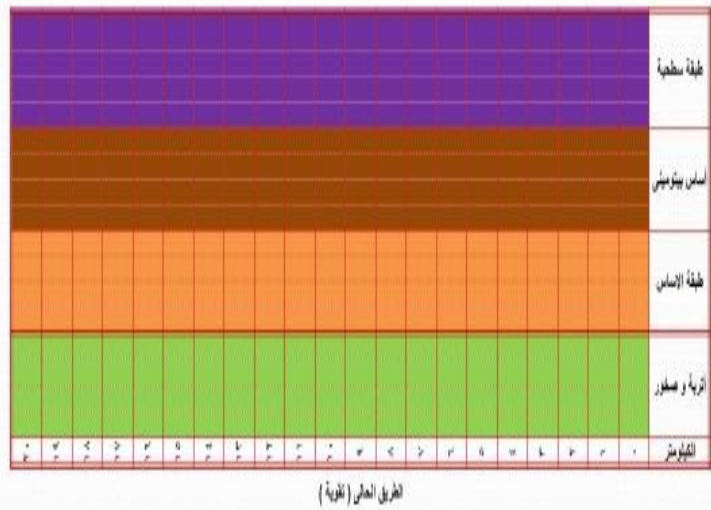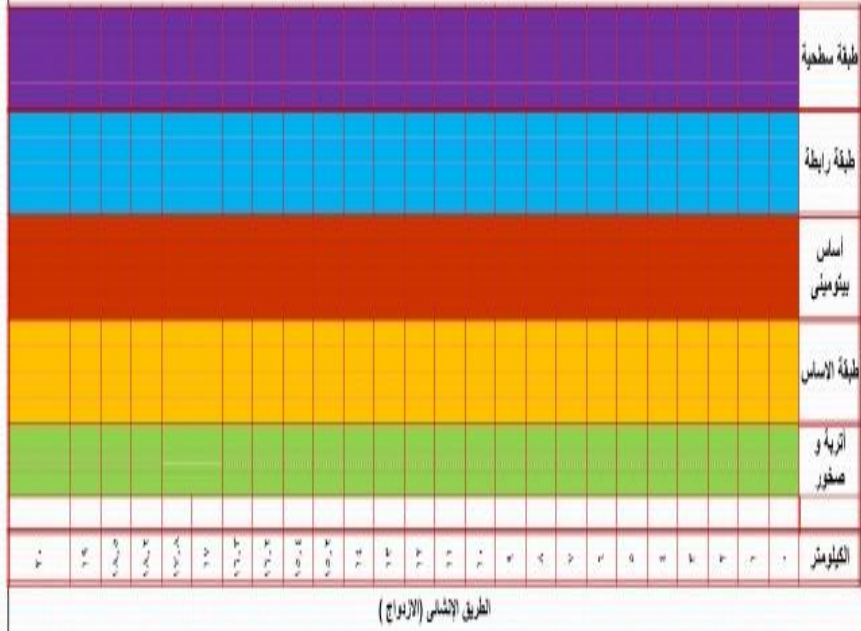

٢٧ كم

تم تعديل التصميم وتم التنفيذ سنة ٢٠١٣ م



الطريق القائم سفاجا / قنا المرحلة الثانية



٣٠ كم

تم تعديل التصميم وتم التنفيذ سنة ٢٠١٣ م



الطريق القائم سفاجا / قنا المرحلة الثانية




٣٧ كم

تم تعديل التصميم وتم التنفيذ سنة ٢٠١٤ م



الطريق القائم سفاجا / قنا المرحلة الثانية

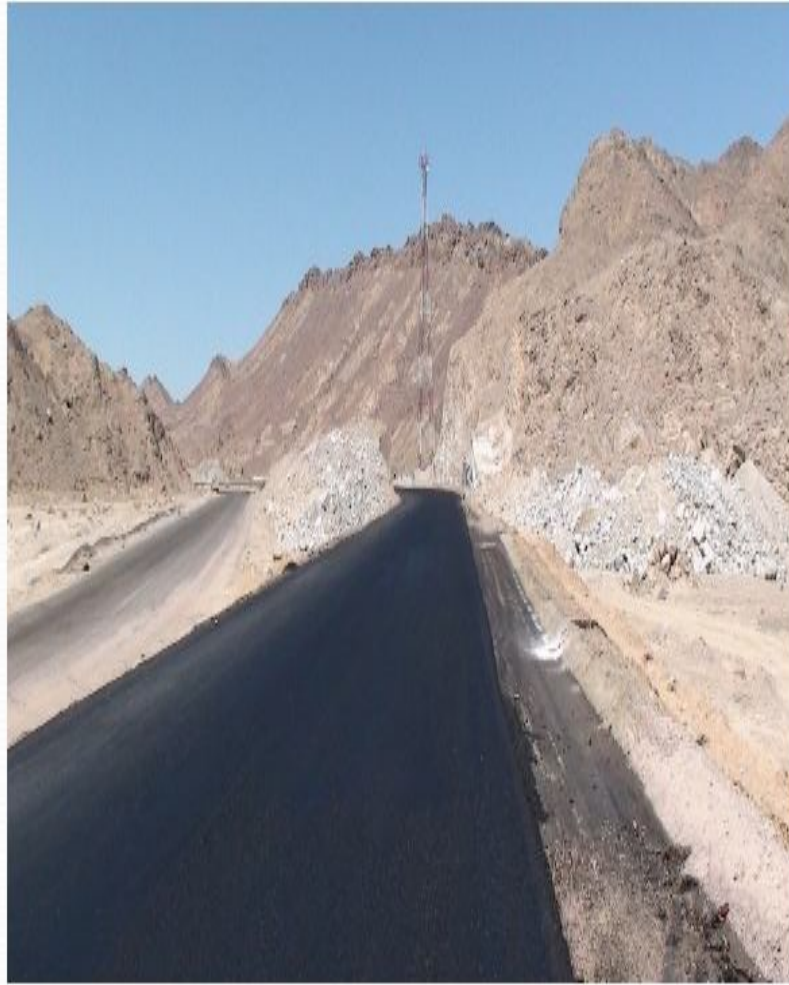

ازدواج الطريق القائم سفاجا / قنا المرحلة الثانية



ازدواج الطريق القائم سفاجا / قنا المرحلة الثانية



الأعمال الصناعية في الطريق الإنشائي



مشروعات المنطقة

ثانياً:-

تقوية واعادة رصف طريق سفاجا / قنا
من كم ٤٠ الى كم ٨٠ بطول ٤٠ كم
تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال

بيان المشروع

- اسم المشروع : تقوية واعادة رصف طريق سفاجا / قنا من كم ٤٠ الى كم ٨٠ بطول ٤٠ كم
- - الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشيونال
- - بدء العمل : ٢٠١٢/٣/٢٩
- - نهو العمل : ٢٠١٥/٤/٣
- - مدة العملية : ٣٦,١٥ شهر
- - - القيمة الاجمالية للمشروع : ٩٩٧٤٣٥٦٢,٥٠ جنيها
- - تم نهو الاعمال

وصف المشروع

- أعمال التقوية وإعادة الرصف للطريق الحالى مع استبدال المنحنيات الأفقية
الخطرة بالطريق بعدد ٢٢ منحنى أفقى مع توسيع عرض الرصف بالمنحنيات
ليصل الى ١٤ متر.


- معالجة النقاط السوداء بالطريق الحالى الذى تم تقويته وإعادة رصفه كما هو
موضح بالكم ٥٢ و ٥٩ و ٦١ و ٦٣ و ٧٦ حيث تم تعديل تصميم المنحنيات
الأفقية لتناسب مع السرعة التصميمية للطريق

مسار مشروع تقوية و اعادة رصف طريق سفاجا / قنا
بطول ٤٠ كم من كم ٤٠ الي كم ٨٠ (حد المنطقة)
مرحلة ثالثة



طريق سفاجا / قنا كم ٥٣

تم تعديل التصميم وجارى التنفيذ

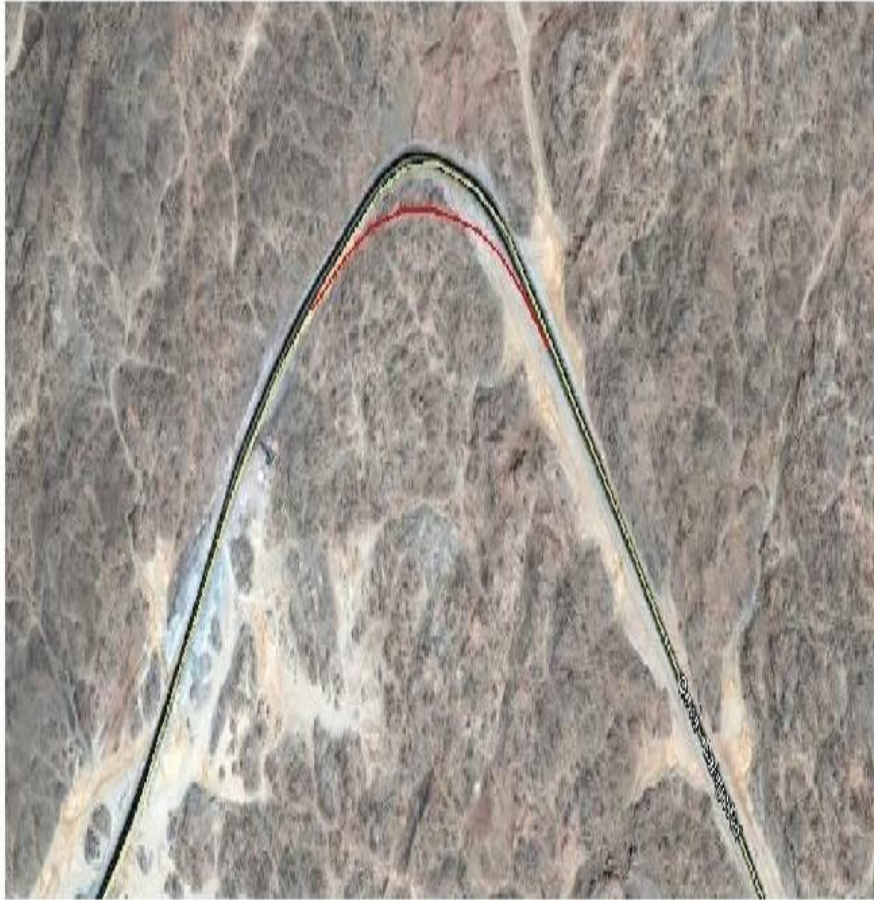

المسار المقترح



طريق سفاجا / قنا كم ٥٩

تم تعديل التصميم وتم التنفيذ



طريق سفاجا / قنا كم ٦١

تم تعديل التصميم وتم التنفيذ




طريق سفاجا / قنا كم ٦١

اعمال تعديل المسار وتكسير الصخور



طريق سفاجا / قنا كم ٦٣ تم تعديل التصميم وتم التنفيذ

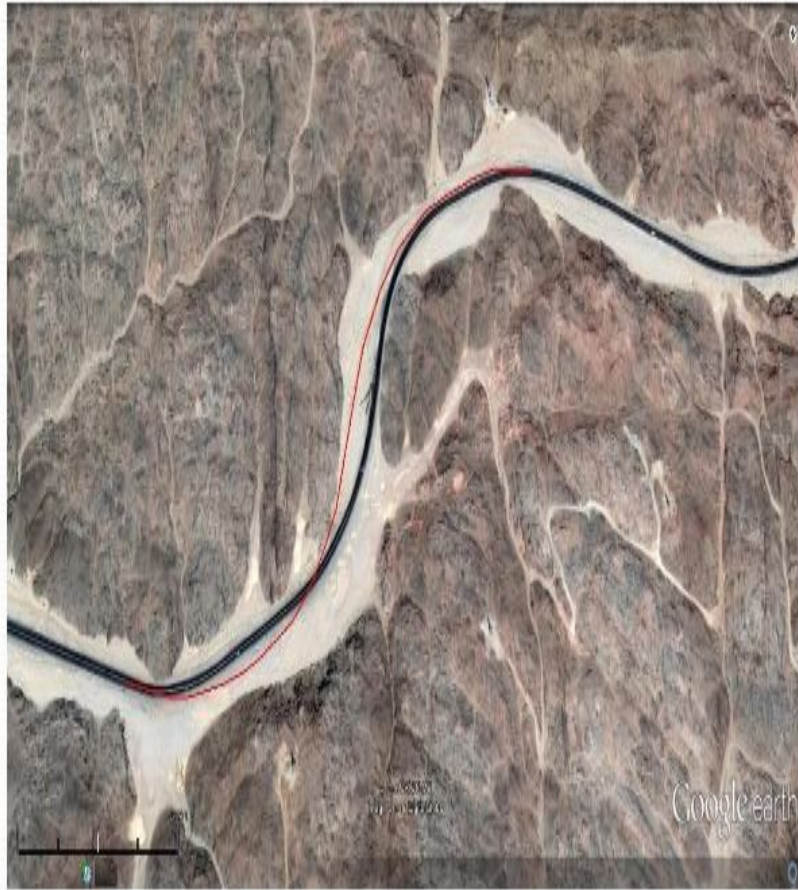

طريق سفاجا / قنا كم ٧٦ تم تعديل التصميم وتم التنفيذ



الطريق بعد التنفيذ



الطريق بعد التنفيذ



مشروعات المنطقة

الثالث:-

انشاء ورصف ازدواج الطريق الدائرى
الخارجى حول مدينة القصير بطول
٢٠ كم

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق
الصحراوية

بيان المشروع

- اسم المشروع : انشاء ورصف ازدواج الطريق الدائرى الخارجى حول مدينة القصير بطول ٢٠ كم
- - الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
- - بدء العمل : ٢٠١٣/٩/١٥
- - نهو العمل : ٢٠١٦/٥/٢٦
- - مدة العملية : ٣٢,٤ شهر
- - نسبة اجمالى المنفذ : ٥٠,٠٦ %
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٨٢,٤٩ %
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٨٩٣٩٥٦٠٠ جنيها
- - قيمة المنفذ : ٤٤٧٤٩٧٤٠ جنيها

وصف المشروع

انشاء الطريق الدائرى الخارجى حول مدينة القصير بداية من كم ١٢,٥ شمال
القصير بطريق القصير /سفاجا يمر غرب المدينة ويتقاطع مع طريق القصير
/قفت بالكم ٣ غرب مدينة القصير ويمتد شمال حتى يتقاطع مع طريق القصير
/مرسى علم بالكم ٧,٥ جنوب القصير
الطريق مزدوج بعرض رصف ٧,٥ لكل اتجاه بجزيرة وسطى تتراوح من ؛
متر الى ٢٥ متر


انشاء ووصف الطريق الدائري الخارجى لمدينة القصير بطول
٢٠ كم مزدوج





دياجرام سير الأعمال

مشروع الطريق الدائري الخارجى لمدينة القصير بطول ٢١ كم . ط (مزدوج)
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

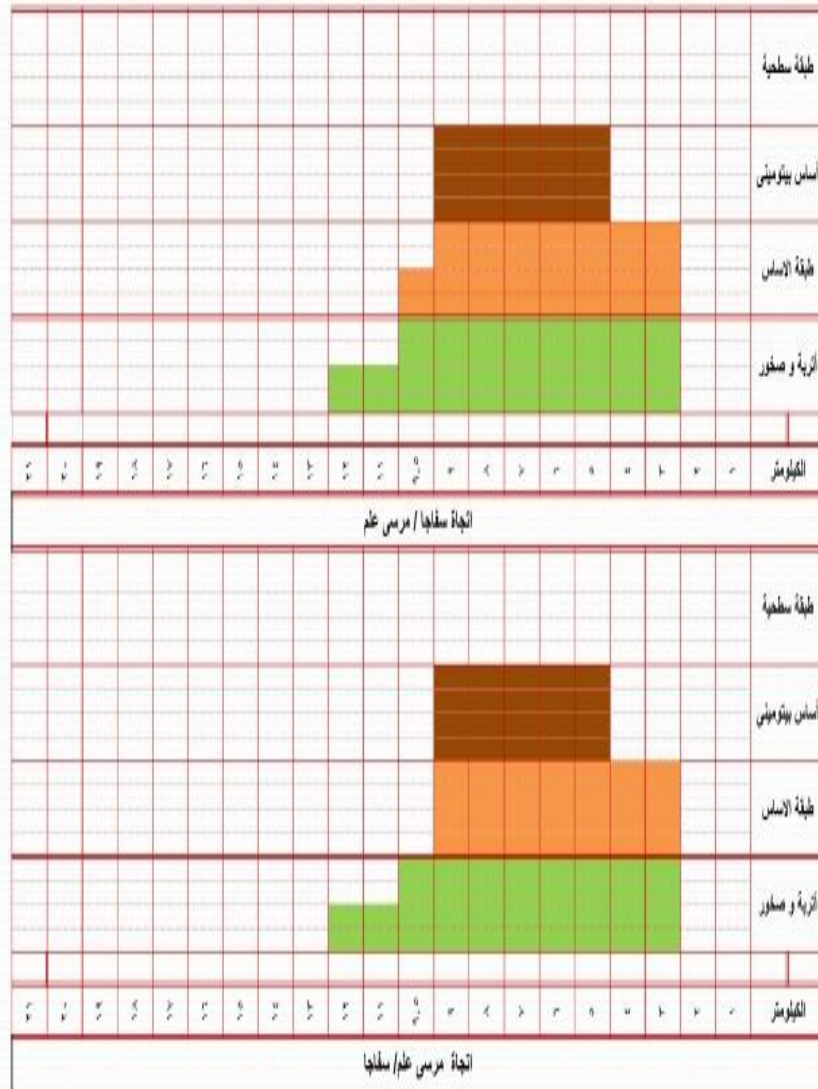

مشروعات المنطقة

رابعاً :-

معالجة اثار السيول بطريقي الزعفرانة
/ الغردقة وراس غارب / الشيخ فضل
تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال

بيان المشروع

- اسم المشروع : معالجة آثار السيول بطريقي الزعفرانة / الغردقة وراس غارب / الشيخ فضل
- - الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشيونال
- - بدء العمل : ٢٠١٢/١١/٢٩
- - نهي العمل : ٢٠١٦/٩/٤
- - مدة العملية : ٤٥,٠٥ شهر
- - نسبة اجمالي المنفذ : ٦٢,٩٥ %
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٧٩,٣٥ %
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٥٨٦٥٩٩٧٥,٠٠ جنيها
- - قيمة المنفذ : ٣٦٩٢٥٢١٨ جنيها

صور عملية

معالجة آثار السيول بطريقي الزعفرانة / الغردقة وراس غارب / الشيخ فضل



مشروعات المنطقة

خامسا :-


رفع كفاءة طريق الغردقة / راس
غارب بطول ٢٠ كم فى المسافة من
الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠ شمال الغردقة
تنفيذ :- شركة النيل العامة لانشاء
الطرق

بيان المشروع

- اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الغردقة / راس غارب بطول ٢٠ كم فى المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠ شمال الغردقة
- الشركة المنفذة : شركة النيل العامة لانشاء الطرق
- - تاريخ بدء العمل : ٢٠١٥/٦/٩
- - تاريخ نهو العمل : ٢٠١٧/٦/٨
- - مدة العملية : ٢٤ شهر
- - نسبة اجمالى المنفذ : ٧,٥٠%
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٢٣,١٥%
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٤٨٧٢٤٨٠٠ جنيها
- - قيمة المنفذ : ٣٦٥٤٧٢٠ جنيها

صور عملية

رفع كفاءة طريق الغردقة / راس غارب بطول ٢٠ كم فى المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٤٠ شمال الغردقة

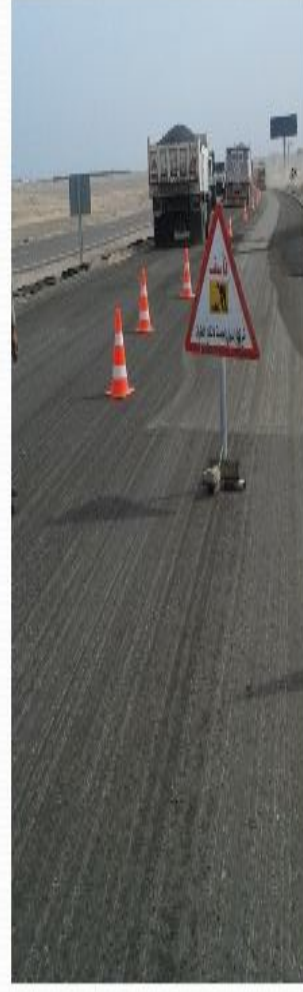

مشروعات المنطقة

سادسا :-

الصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق

منطقة البحر الأحمر جنوب الغردقة

تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال

بيان المشروع

- اسم المشروع: الصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الأحمر جنوب الغردقة
- الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشيونال
- - بدء العمل : ٢٠١٥/١١/١
- - نهي العمل : ٢٠١٧/٩/٢٦
- - مدة العملية : ٢٢,٨٧ شهر
- - نسبة اجمالي المنفذ : ٠,٦٩%
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٣,٤٥%
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٢٦٧٩٩٦٠٠ جنيها
- - قيمة المنفذ : ٣٥٥٥٣٦ جنيها

صور عملية

الصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الأحمر جنوب الغردقة



بيان المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة البحر الاحمرحتى
نوفمبر ٢٠١٥ م تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحة

م	المشروع	الشركة	تكلفة المشروع الفعلية	إجمالى المنفذ	نسبة المنفذ	تاريخ نهو الأعمال	نسبة ما انقضى من مدة %
١	انشاء ورفص طرق بالمركز السياحى مرسى شجراء بطريق مرسى علم / القصير بطول ٣ كم	شركة السلام انترناشيونال	٤٩٣٢٨٨٠	١٧٠٧٩٩٠	%٣٤,٦٢	٢٠١٦/٠٣/٢٨	٦٦,٠٣
	الإجمالى	الى	٤٩٣٢٨٨٠	١٧٠٧٩٩٠	٣٤,٦٢		

مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية



- انشاء ورصف طرق بالمركز
السياحي مرسى شجراء بطريق
مرسى علم / القصير بطول ٣ كم
تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال


مسار مشروع طريق مرسى شجرا بطول ٣ كم



بيان المشروع

- اسم المشروع: إنشاء ورصف طرق بالمركز السياحي مرسى شجراء بطريق مرسى علم / القصير بطول ٣ كم
- الشركة المنفذة: شركة السلام انتر ناشيونال
- - بدء العمل: ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥ م
- - نهو العمل: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٦ م
- - مدة العملية: ١٢ شهر
- - نسبة اجمالي المنفذ: ٣٤,٦٢%
- - نسبة ما انقضى من المدة: ٦٦,٠٣%
- - القيمة الاجمالية للمشروع: ٤٩٣٢٨٨٠ جنيه
- - قيمة المنفذ: ١٧٠٧٩٩٠ جنيه

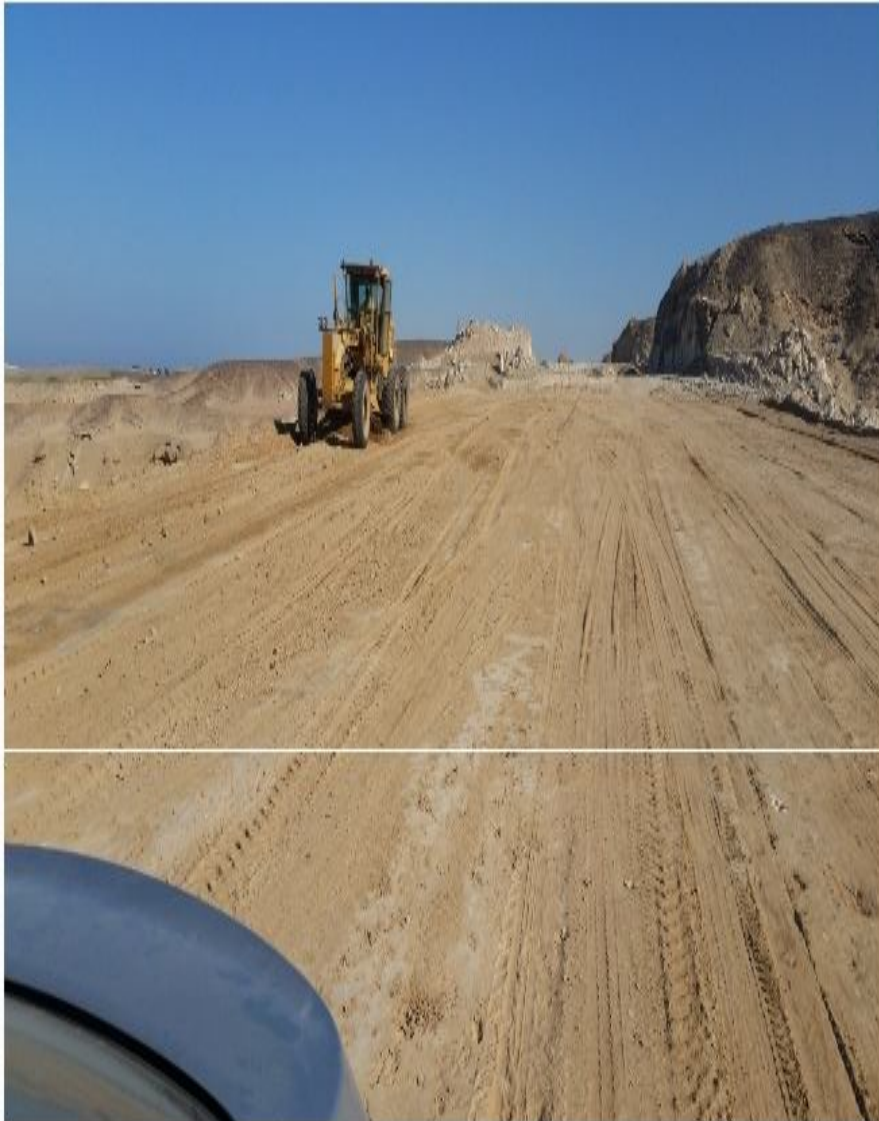



بيان المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة البحر الاحمر
حتى نوفمبر ٢٠١٥م تمويل محافظة البحر الاحمر

م	المشروع	الشركة	تكلفة المشروع الفعلية	إجمالى المنفذ	نسبة المنفذ	تاريخ نهو الأعمال	نسبة ما انقضى من مدة
١-	اعمال انشاء و رصف طرق داخلية بمدينة سفاجا	شركة السلام انترناشيونال	٤٧١٥٨٠٠٠	٤٢٣٣٩٨٥٠٠	%٨٩,٨٥	٢٠١٦/٠١/٢٣	%٩٤,٢٠
٢-	اعمال رصف شوارع مدينة مرسى علم واستكمال تقسيم الشباب والصفاء	شركة النقى للمقاولات	١٠٤٦١٣٠٠	٩٦٩٦٣٥٧	%٩٢,٦٦	٢٠١٥/١٢/١٦	%٩٦,٦٨
٣-	اعمال استكمال انشاء و رصف طرق داخلية بمدينة القصير	شركة الطرق الصحراوية	٣٠٠٠٠٠٠	١٤٠٣٥٥٠٠	%٤٦,٧٩	٢٠١٦/١٢/٤م	%٣١,٥٧
		الإجمالى	١٧٥٢٣٨٦٣٠	١٣٠٢٤٦٣٧٤	%٧٤,٣٣		

مشروعات تمويل المحافظة

أولاً :

• إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة
سفاجا

تنفيذ :- شركة السلام انترناشيونال

بيان المشروع

- اسم المشروع : انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة سفاجا
- الشركة المنفذة : شركة السلام انتر ناشيونال
- - بدء العمل : ١٠ / ٤ / ٢٠١٣ م
- - نهي العمل : ٢٣ / ١ / ٢٠١٦ م
- - مدة العملية : ٣٢,٥ شهر
- - نسبة اجمالي المنفذ : ٨٩,٩١%
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٩٤,٢%
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٤٧١٥٨٠٠٠ جنيه
- - قيمة المنفذ : ٤٢٣٩٨٥٠٠ جنيه

صور عملية
إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة سفاجا



مشروعات تمويل المحافظة

ثانياً :

• رصف شوارع مدينة مرسى علم

واستكمال تقسيم الشباب والصفاء

تنفيذ :- شركة التقوى للمقاولات

بيان المشروع

- اسم المشروع : رصف شوارع مدينة مرسى علم واستكمال تقسيم الشباب والصفاء
- الشركة المنفذة : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- - بدء العمل : ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ م
- - نهو العمل : ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ م
- - مدة العملية : ١٢ شهر
- - نسبة اجمالي المنفذ : ٩٢,٦٦%
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٩٦,٦٨%
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ١٠٤٦٤٣٠٠ جنيه
- - قيمة المنفذ : ٩٦٩٦٣٥٧ جنيه

صور عملية

رصف شوارع مدينة مرسى علم واستكمال تقسيم الشباب والصفاء



مشروعات تمويل المحافظة

ثالثا :

● استكمال انشاء ورصف طرق داخلية

بمدينة القصير

تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات

الطرق والكبارى

بيان المشروع

- اسمك المشروع :استكمال انشاء ورصف طرق داخلية بمدينة القصير
- الشركة المنفذة : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
- - بدء العمل : ٥ / ٦ / ٢٠١٥ م
- - نيهو العمل : ٤ / ١٢ / ٢٠١٦ م
- - مدة العملية : ١٨ شهر
- - نسبة اجمالى المنفذ : ٤٦,٧٩%
- - نسبة ما انقضى من المدة : ٣١,٥٧%
- - القيمة الاجمالية للمشروع : ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
- - قيمة المنفذ : ١٤٠٣٥٥٠٠٠ جنيه

صور عملية
إستكمال إنشاء ورفف طرق داخلية بمدينة القصير



مقترح خطة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

م	المشروع	التكلفة الحالية طبقاً لآخر مقبسة	تاريخ التمهيد	الاعتماد المقترح بخطة ٢٠١٧/٢٠١٦	ملاحظات
١	انشاء طريق برنيس / حلاب و رفع كفاءة واعادة رصف طريق برنيس / الشلاتين بطول ٥٥ كم في المسافة من راس برناس وحتى كم ٣٧ جنوب برنيس (مرحلة أولى)	٦٧٨٧٥٠٠٠ جنيه	لم يتم تسليم الموقع	٦٧٨٧٥٠٠٠	
٢	انشاء طريق برنيس / حلاب و رفع كفاءة واعادة رصف طريق برنيس / الشلاتين بطول ٥٥ كم في المسافة من كم ٣٧ وحتى كم ١٠ شمال الشلاتين (مرحلة ثانية)	٦٥٥٦٩٠٠٠ جنيه	لم يتم تسليم الموقع	٦٥٥٦٩٠٠٠	
٣	انشاء طريق برنيس / حلاب - رفع كفاءة واعادة رصف طريق ابوراماد / حلاب بطول ٤٠ كم	٥٤١٠١٠٠٠ جنيه	لم يتم تسليم الموقع	٥٤١٠١٠٠٠	
٤	صيانة وعادة رصف الطريق الشرياني لمنبئة مرسى علم بطول ٢٢ كم , ط واستبدال المحطيات الافقية الخطرة	٤٥١٨٠٠٠٠ جنيه	جارى الطرح	٤٥١٨٠٠٠٠	
٥	تعديل مسار طريق القصور / فقط بمواقع الحوادث باكم ٢٠ & ٢٠ كم بطول ٢٠ كم	١٠٦٠٠٠٠٠٠ جنيه	لم يتم الطرح	١٠٦٠٠٠٠٠٠	
٦	استكمال انشاء ورصف وتطوير الطريق الدائري الاوسط بمنبئة الفرندة بطول ٢٠ كم , ط(رفع كفاءة الطريق الحالي)	١١٢٠٠٠٠٠٠	تحت الدراسة	١١٢٠٠٠٠٠٠	
الاجمالي				٥٠٧٣٥٠٠٠٠	

مشروعات تحت الدراسة

م	المشروع	ملاحظات
١	دراسة استكمال ازدواج سفاجا / القصير / مرسى علم	
٢	دراسة استكمال ازدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب	
٣	دراسة ازدواج طريق القصير / فقط	
