

رَبِّ زَيْنِ عَبْدِنَا  
وَقُلِّبْنَا

متابعة

موقف تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها  
بمدينة الشلاتين وقراها في مختلف قطاعات  
الخدمات

خطة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

# قطاع الكهرباء

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
إنشاء مبنى شبكة جهد منخفض بمدينة الشلاتين	وزارة الكهرباء	٢٣ مليون جنية	تم إنشاء المبنى ١٠٠%
توصيل خط كهرباء بالمجزر	وزارة الكهرباء	٥,١ مليون جنية	٦٠% جاري العمل
وحدة توليد كهرباء قدرة ٢٧٥ ك وات منطقة الخير	الوحدة المحلية	نقلا من راس حدربة	١٠٠% تم التشغيل
اجمالي مشروعات الكهرباء والطاقة		٢٨,١ مليون جنية	



# قطاع الطرق

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ	
استكمال رصف طريق الشلاتين سو هين بطول ٢١٠ كم	القوات المسلحة	٩٠ مليون ج	تم الانتهاء من رصف الطريق بنسبة ٩٨%	
رصف طريق الخير- ابرق بطول ٢٠ كم	جهاز التعمير بالبحر الأحمر	١٧,٤١٧ مليون ج	٩٢% وجاري العمل	
رصف طريق بوادي حوضين بطول ٩ كم		٦,٩٧ مليون ج	٣٥% وجاري العمل	
تطوير ورفع كفاءة طريق ابوسعفه- ديف بطول ١٧ كم		٢,٣٠٨ مليون ج	١٠٠%	
استكمال رصف طرق داخلية بمدينة الشلاتين بطول ١٠ كم		١١,٩٦٤ مليون ج	١٠٠%	
رصف طرق بطول ٣ كم بمرسي حميره - الشلاتين			١٠٠%	
اجمالي مشروعات الطرق			١٢٧,٠٣ مليون ج	



## منافذ بيع الاسماك

نسبة التنفيذ	التكلفة التقديرية	الجهة المنفذة	اسم المشروع
١٠٠%	(١) مليون جنيه	المقاولون العرب	منفذ بيع الأسماك بقرية الصيادين بمدينة الشلاتين
١٠٠%			منفذ بيع الأسماك خلف الاسكان الاجتماعي بمدينة الشلاتين
١٠٠%			منفذ بيع الأسماك بقرية الصيادين بقرية مرسى حميره
	٣ مليون		اجمالي مشروعات منافذ بيع الأسماك





# قطاع مياه الشرب

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
محطة تحليه مياه المجزر بطاقة ٣٠٠٠ م/يوم	المقاولون العرب	١٢٩,٦ مليون جنيه	٩٨%
شبكة مياه رئيسيه بطول ٦٨ كم وأيضا الوصلات المنزلية	المقاولون العرب	٢٦,٧٠٩ مليون جنيه	لم يتم استكمالها لتغطي مناطق الشبكة القديمة
الاجمالي		١٥٦,٣٠٩ مليون جنيه	




## قطاع الاسكان

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
إنشاء ٣٥٠ وحدة أسكان توطين	جهاز تعمير البحر الأحمر	٥٤ مليون جنيه	تم الانتهاء من إنشاء عدد ١٥٠ وحدة سكنية وباقي الوحدات ٢٠٠ وحدة تم الانتهاء بنسبة ١٠٠% ولم يتم توصيل الكهرباء ومطلوب انشاء منطقة خدمات
إنشاء عدد ٧٨ وحدة (٢٤ بأبرق- ٢٤ بمنطقة الخير - ٣٠ بمرسي حميره)	المقاولون العرب	١٩,١٣٦ مليون جنيه	٨٥% وجاري العمل بالمواقع الثلاثة ومطلوب انشاء منطقة خدمات
إنشاء عدد ١٥ عمارة سكنيه باحمالي ٢٤٠ وحده		٦٠ مليون	٩٥% وجاري العمل والتسليم متأخر عن المخطط الزمني
إجمالي مشروعات الاسكان		١٣٣,١٣٦ مليون جنيه	



## قطاع التضامن الاجتماعي

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
أنشاء وحدة اجتماعيه بقرية ابرق	المقاولون العرب	١,٥٠٠ مليون جنيه	١٠٠% و لم يتم التشغيل
أنشاء وحدة اجتماعيه بقرية مرسى حميره		١,٤٠٠ مليون جنيه	١٠٠%
الاجمالي		٢,٩ مليون جنيه	

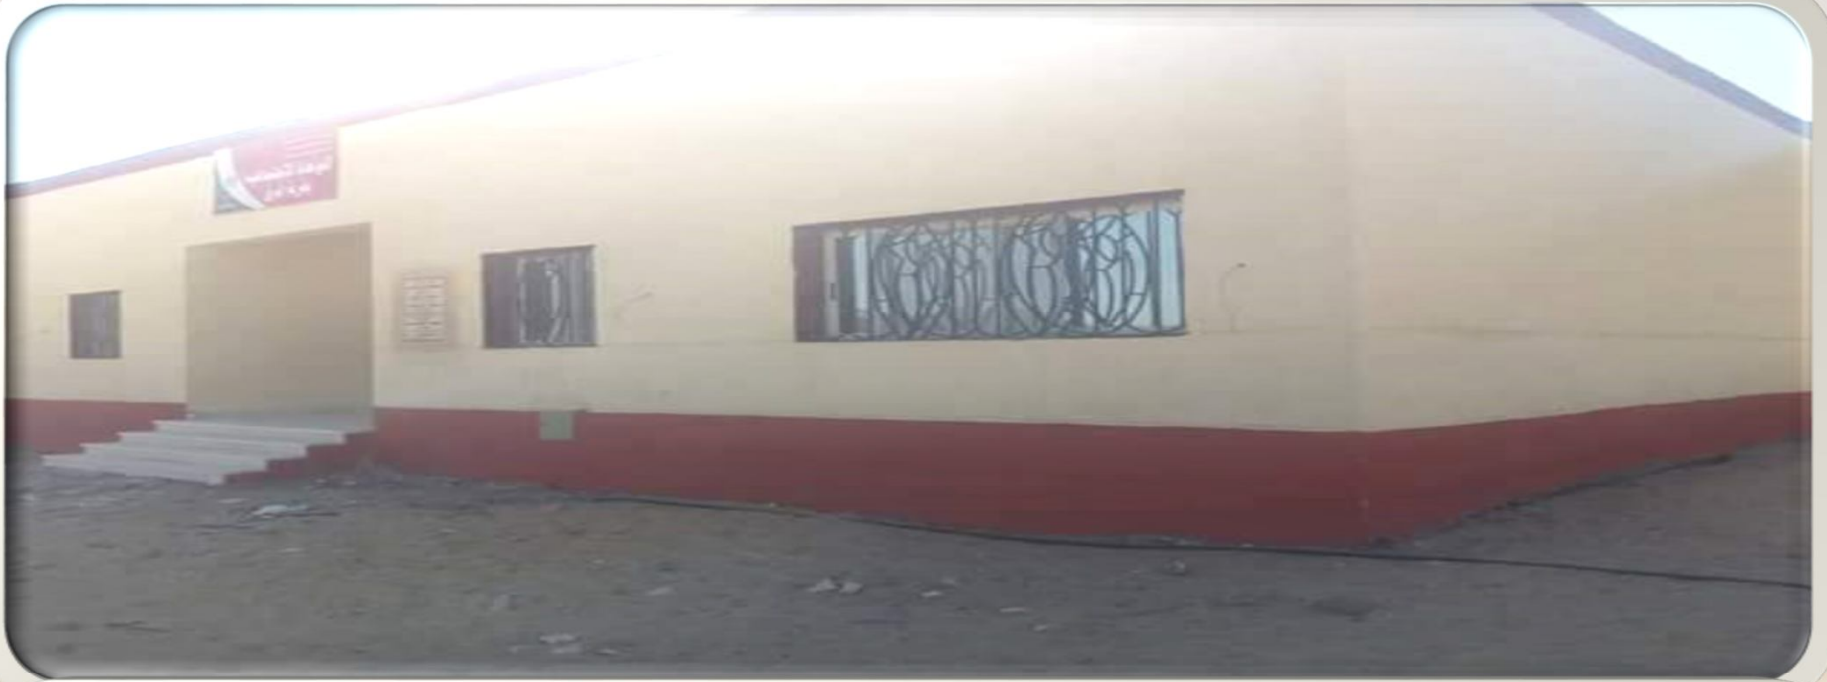

# قطاع الامن

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
أنشاء وحدة إطفاء حريق بقرية مرسى حميره	المقاولون العرب	١ مليون جنيه	٨٠% و جاري العمل
أنشاء نقطة شرطه بقرية مرسى حميره		٢ مليون جنيه	لم يتم التنفيذ
الاجمالي		٣ مليون جنيه	





# قطاع الشباب والرياضة

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
استكمال نزل الشباب بالشلاتين	وزارة الرياضة المجلس القومي	١٠ مليون جنيه	جاري استكمال الاعمال ونسبة التنفيذ ٥٠%



# قطاع المواني

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	موقف التنفيذ
أنشاء ميناء صيد بمدينة الشلاتين	المقاولون العرب	١٥٠ مليون جنيه	تم البدء في أعمال الحفر وتوقف العمل اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧



# قطاع المجازر

اسم المشروع	الجهة المنفذة	التكلفة التقديرية	نسبة التنفيذ
أنشاء مجز آلي بمدينة الشلاتين	هيئه الأوقاف إشراف جهاز التعمير	٤٩ مليون جنيه	٩٨% وجرى العمل بصورة بطيئة





**المشروعات التنموية والزراعية بمدينة الشلاتين**

## في مجال حفر الآبار

نسبة التنفيذ	الجهة المنفذة	اسم المشروع
تم الحفر للآبار و توريد محطة تحليه مياه قدرة ١٨ م٣/ساعة بوادي حوضين وتم تشغيلها.وجاري حفر بئر مياه عميق ليصبح إجمالي الآبار عدد٣بوادي حوضين	جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة	- حفر عدد ٢ بئر مياه بعمق ١٢٠ م بوادي ديف - حفر عدد ٢ بئر مياه بعمق ١٢٠ م بوادي حوضين - تطهير عدد ٤ آبار بوادي ابوسعفه وديف إحدى توابع قرية ابرق ومناطق عمل مشروع وزارة الزراعة





## في مجال شبكات الري

اسم المشروع	الجهة المنفذة	نسبة التنفيذ
١- مد شبكات ري رئيسيه وفرعيه لزراعة ١٠٠ فدان بوادي حوضين	وزارة الزراعة	- ١٠٠% وتم عمل زراعات مكشوفة
٢- مد شبكات ري رئيسيه وفرعيه لزراعة ١٠٠ فدان بوادي ديف بقرية ابرق		- ١٠٠% ولم تتم الزراعات - تم توريد وتركيب محطة تحليه مياه بطاقة ١٥٠م٣ يوم وتم التشغيل

# في مجال الصوبات الزراعية

اسم المشروع	الجهة المنفذة	نسبة التنفيذ
توريد وتركيب عدد ٩٠ صوبة زراعية بالمدينة وقراها	جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة	<p>تم توريد وتركيب عدد ٤٠ صوبة زراعية كالتالي:-</p> <p>١- عدد ١٥ صوبة زراعية بوادي ابوسعفه ولم يتم زراعتهم خلال هذا الموسم الزراعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لعدم وجود مياه</p> <p>٢- عدد ١٥ صوبة زراعية بوادي ديف وتم زراعتهم بالخضروات هذا الموسم وذلك بواسطة وزارة الزراعة</p> <p>٣- عدد ١٠ صوبة زراعية بمركز بحوث الصحراء بالمدينة تم زراعة عدد ٥ صوبه بالخضروات هذا الموسم الزراعي بواسطة مركز بحوث الصحراء</p> <p>عدد ٤٨ صوبة زراعية بوادي حوضين كالتالي:-</p> <p>- تم زراعة ٥ صوبة فلفل عدد ٥ صوبة باذنجان عدد ٥ صوبة كوسة وعدد ٧ صوبة طماطم عدد ٨ صوبة خيار وعدد ١٨ صوبة هيدروبونيك لم يتم زراعتها حتي تاريخه</p> <p>عدد ٢ صوبة بمنطقة السنطة إحدى توابع ابرق تم الاعداد والتجهيز خلال هذا الموسم</p> <p>- تم زراعة مساحة ٣٠ قيراط أشجار المورنجا وجاري تحميل زراعته البطيخ في نفس المساحة</p> <p>تم الاعداد والتجهيز لزراعة ٣٦ قيراط كنتالوب وبطيخ</p>



# الألات والمعدات

اسم المشروع	الجهة المنفذة	نسبة التنفيذ
توريد عدد (١٠) جرار زراعي	جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة	تم توريد عدد(٥)جرار زراعي منهم عدد ٤ بمشروعات وزارة الزراعة وعدد ١ جرار بمحطة بحوث الصحراء بمدينة الشلاتين - تم توريد عدد ٤ جرار قدرة ٦٥ حصان للصبوب منهم ٣بمشروعات وزارة الزراعة وعدد ١جرار بمحطة بحوث الصحراء بمدينة الشلاتين -تم توريد عدد٩وحدة توليد كهرباء بديف ووادي حوضين



# الثروة السمكية

اسم المشروع	الجهة المنفذة	نسبة التنفيذ
الثروة السمكية	وزارة الزراعة	<p>- تم إنشاء عدد ٦ أحواض لتربية الأسماك بوادى حوضين وتم التشغيل .</p> <p>-تم توريد كرفان سكن إداري خاص بالمزارع السمكية وتم التشغيل.</p> <p>-تم توريد مجفف شمسي للنباتات الطبية والعطرية يحتوي علي ١٢٤ حامل لتجفيف ٣١٠ كجم .</p> <p>-تم تركيب عدد ٢ هنجر لتعبئة النباتات الطبية والعطرية</p>







و شكارا
